

DOCUMENTO 6
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

O Instrumento de Verificação deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo Corpo de Bombeiro Militar aos clubes que pleiteiem utilizar estádios classificados como de Grande Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total de público superior a 10.000 pessoas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1 A edificação possui todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?	
15.471 (quinze mil quatrocentos e setenta e um).	
1.4 Qual a atual capacidade de público sugerida para o estádio?	
15.471 (quinze mil quatrocentos e setenta e um).	
2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO	
2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM ()	NÃO (X)

2.2 Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?	
SIM (X) Obs.: influencia somente na área de apoio e não na saída de emergência	NÃO ()
2.3 Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?	
SIM ()	NÃO (X)
3. EXTINTORES DE INCÊNDIO	
3.1 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades e tipicidades?	
SIM (X)	NÃO ()
3.2 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?	
SIM ()	NÃO (X) Obs.: agente extintor fora do prazo de validade.
3.3 O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?	
SIM ()	NÃO (X)
4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, DAS FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO	
4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?	
SIM (X)	NÃO ()

4.2 O sistema de hidrantes está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?	
SIM (X)	NÃO ()
4.3 O sistema de hidrantes está em pleno funcionamento?	
(X) Sim () Não () Parcialmente	
4.4 O estádio possui caixas de incêndio?	
SIM (X)	NÃO ()
4.5 As caixas de incêndio estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico aprovado?	
SIM (X)	NÃO ()
4.6 As caixas de incêndio estão em pleno funcionamento?	
(X) Sim () Não () Parcialmente	
4.7 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?	
SIM (X)	NÃO ()
4.8 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	NÃO ()
4.9 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?	
SIM ()	NÃO (X)

4.10 Qual o período da manutenção do sistema de hidrantes?	
☐ Mensal ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☒ Não possui selo de manutenção.	
4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?	
SIM (X)	NÃO ()
4.12 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?	
SIM (X) Obs.: próximo ao 24º BPM	NÃO ()
4.13 Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?	
SIM ()	NÃO (X)
4.14 Qual o tipo de reservatório?	
☐ Cisternas ☐ Outro Manancial	
4.15 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?	
SIM ()	NÃO (X)
4.16 A edificação possui sistema de chuveiros?	
SIM ()	NÃO (X)
4.17 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?	
SIM ()	NÃO ()

4.18 Qual o período da manutenção?

- () Mensal
() Trimestral
() Semestral
() Anual
(X) Não possui selo de manutenção

5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

SIM ()

NÃO (X) Obs.: IT-36 (SPDA) foi revogada.

5.2 O SPDA está de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?

SIM ()

NÃO (X) Obs.: IT-36 (SPDA) foi revogada.

5.3 O SPDA possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?

SIM ()

NÃO (X) Obs.: IT-36 (SPDA) foi revogada.

5.4 Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

SIM ()

NÃO (X) Obs.: IT-36 (SPDA) foi revogada.

5.5 Qual o período da manutenção do SPDA?

- () Mensal
() Trimestral
() Semestral
() Anual
Obs.: IT-36 (SPDA) foi revogada.

6. SISTEMA MOTOGERADOR

6.1 A edificação possui grupo motogerador?

SIM ()

NÃO (X)

6.2 Qual a quantidade?

() 0

() 1

() 2

() 3

() 4

() 5

() Outro. Quantidade _____

Obs.: possui grupo motogerador

6.3 Qual o volume de combustível de cada gerador?

Até 250L ()

Acima de 250L ()

Obs.: possui grupo motogerador

6.4 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?

Obs.: possui grupo motogerador

SIM ()

NÃO ()

Obs.: possui grupo motogerador

6.5 O grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, a fim de orientar o espectador a localização das saídas?

SIM ()

NÃO (X)

Obs.: possui grupo motogerador

6.6 O grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?

SIM ()

NÃO (X)

Obs.: possui grupo motogerador

7. SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS

7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM (X)

NÃO ()

7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência

SIM (X)

NÃO ()

7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas) estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

SIM (X)

NÃO ()

7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?

SIM (X)

NÃO ()

7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

SIM (X)

NÃO ()

7.6 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?

SIM (X)

NÃO ()

7.7 Existe algum anteparo fixo que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?

☐ Portão ☐ Grade ☐ Cerca ☐ Outro ☒ Não existe	
7.8 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?	
SIM (X)	NÃO ()
7.9 As portas ou portões de saída possuem barras antipânico?	
SIM ()	NÃO (X)
7.10 Existem portões de emergência que permita a passagem do público para o campo?	
SIM ()	NÃO (X)
7.11 Os portões de emergência são adequados?	
SIM (X)	NÃO ()
7.12 Os acessos à edificação são providos de catracas?	
☒ Simples ☐ Eletrônicas ☒ Removíveis ☐ Próprias ☐ Sem catracas	
7.13 As catracas são reversíveis?	
SIM ()	NÃO (X)

7.14 As catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?

SIM ()

NÃO (X)

7.15 A edificação possui plano de emergência?

SIM ()

NÃO (X)

7.16 As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?

SIM (X)

NÃO ()

7.17 Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de portas de bar)? enrolar ou portas de subir e descer, tal qual

SIM ()

NÃO (X)

7.18 Os acessos radiais estão sinalizados em amarelo em cor que contrasta com o piso (geralmente)?

SIM (X)

NÃO ()

7.19 Os pisos são antiderrapantes?

SIM (X)

NÃO ()

8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

8.1 O estádio possui iluminação de emergência?

SIM (X)

NÃO ()

8.2 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

SIM ()	NÃO (X)
9. ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS	
9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?	
☒ Cozinha ☒ Bar/ Lanchonete ☐ Removíveis ☐ Próprias	
9.2 Quantos?	
Cozinha: 01 Bar/ Lanchonete: 04 Outros: __	
9.3 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?	
SIM ()	NÃO (X)
9.4 Caso haja, qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?	
☐ Central de GLP ☐ Botijão de GLP ☐ Gás Natural Canalizado ☒ Somente botijão P-13	
9.5 Está de acordo com a legislação vigente?	
SIM (X)	NÃO ()
9.6 Há documento de responsabilidade técnica?	
☐ ART ☐ RRT ☒ Não há documento	
9.7 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?	
SIM ()	NÃO (X)

10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO

10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e s alvamento condições para executarem suas respectivas ações?

SIM (X)

NÃO ()

10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?

SIM (X)

NÃO ()

10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?

SIM (X)

NÃO ()

10.4 O estádio possui cadeiras? (Caso não possua, avance para a questão 10.11)

SIM (X)

NÃO ()

10.5 As cadeiras são rebatíveis?

SIM ()

NÃO (X)

10.6 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?

SIM ()

NÃO (X)

10.7 Qual a largura útil de cada cadeira?

Menor que 42cm ()

42cm ou maior (X)

10.8 Qual a distância entre os eixos das cadeiras instaladas?

Menor que 50cm ()

50cm ou maior (X)

10.9 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?

SIM (X)

NÃO ()

10.10 Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

() Menor que 35cm

() Entre 36 e 40cm

(X) 41cm ou maior

10.11 Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares? (Caso o estádio possua cadeiras, avance para a próxima seção)

Altura

(X) Entre 20 e 50cm

() Entre 51 e 57cm

() Maior que 57cm

Largura

() Menor que 75cm (

(X) Entre 75 e 85cm

() Maior que 85cm

11. BRIGADA DE INCÊNDIO

11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio?

SIM (X)

NÃO ()

11.2 Caso exista, atende à legislação vigente?

SIM ()

NÃO (X)

12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME E COMUNICAÇÃO	
12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?	
SIM ()	NÃO (X)
12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?	
SIM (X)	NÃO ()
13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO	
13.1 A edificação possui mapa de localização?	
SIM ()	NÃO (X)
13.2 O mapa de localização informa:	
☐ Localização do espectador ☐ Saídas mais próximas ☐ Trajeto até as saídas ☐ Telefones da sala de segurança da edificação	
13.3 A edificação possui placas indicativa de capacidade total do público de acordo com as normas especificadas?	
SIM (X)	NÃO ()
13.4 A edificação possui placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas especificadas?	
SIM ()	NÃO (X)

14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E EMERGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE

14.1 A edificação possui fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

- ☐ Sim, em lados opostos
☒ Sim, em apenas um lado
☐ Não

14.2 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?

SIM ☐

NÃO ☒

14.3 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?

SIM ☐

NÃO ☒

14.4 Caso haja, quantos são os postos?

- ☐ 1 a 3
☐ 3 a 6
☐ 6 a 9
☒ 9 a 12
☐ Mais de 12

DIAGNÓSTICO

Restrição 1: Todos os extintores estão com o agente extintor (carga) vencidos. Falta o extintor sobre rodas previsto na subestação convencional situada nos fundos da área dos vestiários.

Providências: Fazer a recarga dos extintores e instalar o extintor sobre rodas na subestação.

Prazo: 60 dias

Fotos:



MINISTÉRIO DO
ESPORTE

GOVERNO FEDERAL


UNIAO E RECONSTRUCAO

Restrição 2: Falta selo do teste hidrostático no corpo das mangueiras do hidrante com prazo de até 12 meses.

Providências: Fazer o teste hidrostático das mangueiras.

Prazo: 60 dias

Fotos:

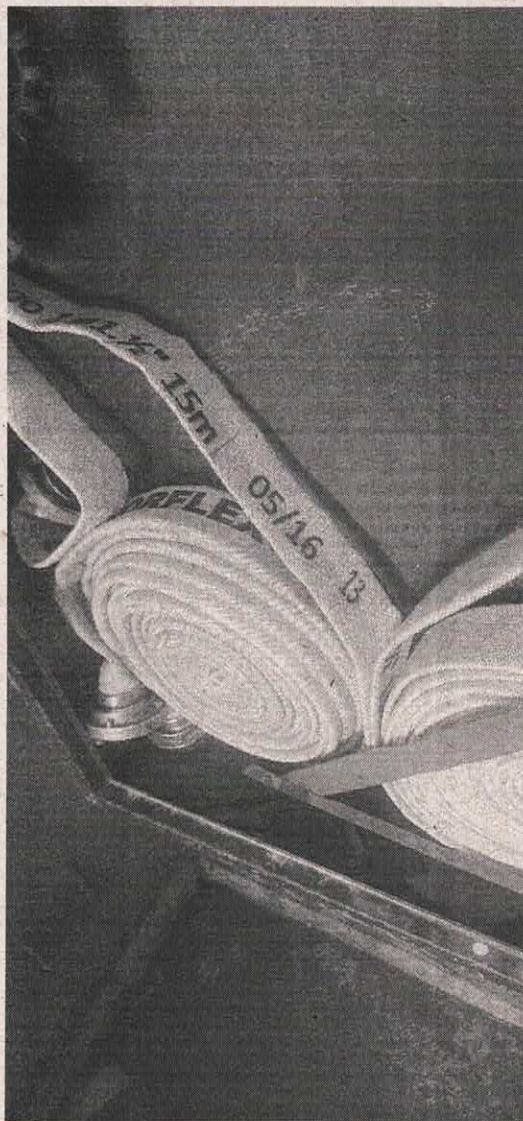

Handwritten signature

Restrição 3: Faltam os faróis de iluminação de emergência que estão projetados para atender a arquibancada coberta.

Providências: Instalar os faróis de iluminação de emergência.

Prazo: 60 dias


Fotos: Não há.



Restrição 4: Acréscimo de áreas cobertas (sala do jecrim; cobertura entre a bilheteria e o pavimento das cabines de rádio e tv; dois mezaninos em estruturas metálicas) não contemplados no PSCIP. Há uma subestação elétrica/sala de trafo situado em uma sala próxima a arquibancada coberta (em baixo das cabines de rádio e tv) não indicada em planta-baixa. Adequar para brigada profissional, item e.12.2 da it-01 10ª edição. Adequar a sinalização de emergência (item e.12.4 da IT-01) colocando placas de população por setores A, B, C e D (folha 15 PSCIP), item A.11.1 e) da IT-03.

Providências: Modificar (atualizar) o PSCIP no setor de análise do CBMMG para aprovação e posteriormente solicitar vistoria de liberação para liberação de novo AVCB.

Prazo: 60 dias ou conforme solicitação de prorrogação de prazo.

Fotos:

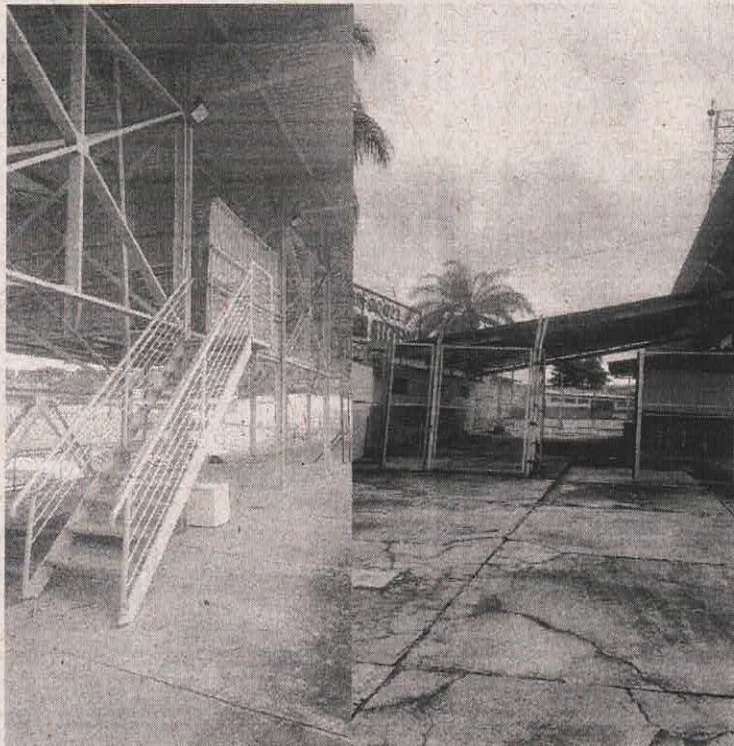

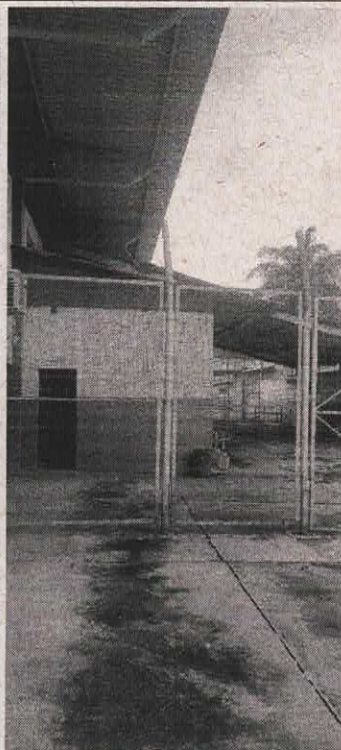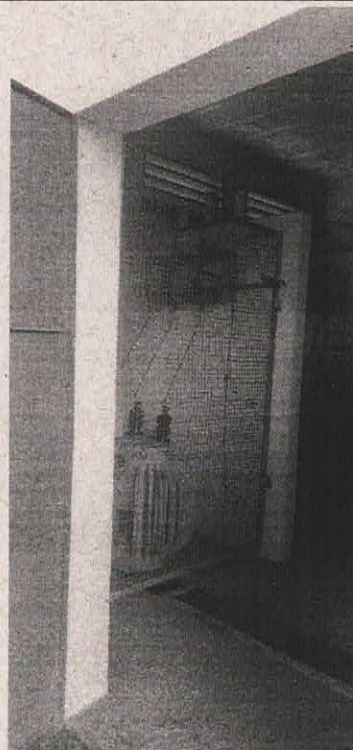


Restrição 5: Falta pintar a tampa do recalque na cor de segurança vermelha.

Providências: Pintar na cor vermelha

Prazo: 60 dias

Fotos:

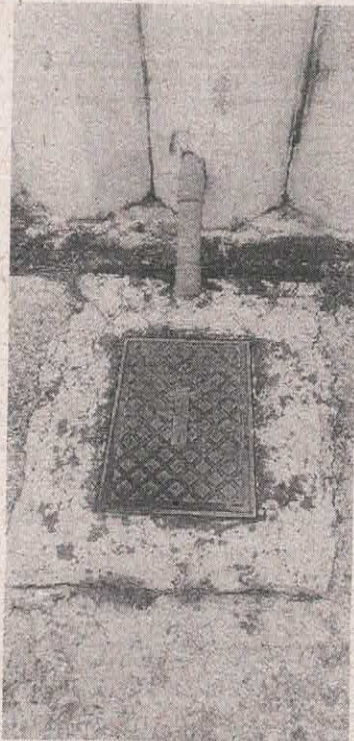

Handwritten signature in blue ink.

PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado ()

Aprovado com Restrição¹ (X)

Reprovado ()

Obs.: no momento da vistoria não havia situação de risco iminente. O Prazo para sanar as restrições n. 1, 2, 3 e 5 são de 60 dias. O prazo para sanar a restrição n. 4 são de 60 dias ou conforme solicitação de prorrogação de prazo a ser apresentado pelo interessado ao CBMMG para análise e deferimento.

RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional: Matheus Felipe Cimino Mota Rocha

Posto: 1º Tenente

Função: Chefe do PPV/Varginha

Assinatura:

Nome do Profissional: Ronaldo Gueli Tomaz Silva

Graduação: 2º Sargento

Função: Vistoriador

Assinatura:

Nome do Profissional: Lucas de Oliveira Tavares

Graduação: 2º Sargento

Função: Vistoriador

Assinatura:

Nome do Profissional: Dailon Valério Mafra

Graduação: 3º Sargento

Função: Vistoriador

Assinatura:

VIGÊNCIA

Data de emissão: 24/03/2025

Prazo de validade: 19/08/2025

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

¹ Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.
